



SOLPARKEN

Kære Beboere

Kontrahering

Der foreligger nu en underskrevet kontrakt med entreprenøren. Lyngby-Taarbæk Kommune har givet grønt lys og entreprenøren er klar til staks at opstarte renoveringsarbejdet.

I forbindelse med kontraheringen er der udarbejdet en revideret hovedtidsplan for byggeriet, hvor entreprenøren opstarter sine arbejder i begyndelsen af maj måned 2022.




Opstart

Som noget af det første, vil entreprenøren etablere sin byggeplads og forberede de kommende arbejder. Byggepladsen vil blive placeret i området som kan ses på fig. 1. (se bagside)

Omkring medio maj opstarter entreprenøren selve projektets arbejder jf. nedenstående tidssplan.

Overordnet tidsplan for udførelsen:

Aktivitet	Omtrentligt tidspunkt
Etablering af byggeplads	Primo maj 2022
Nye kældertrapper blok 5 – opgang 15B – 23B	Maj-juli 2022
Nye kældertrapper blok 6 – opgang 11A – 15A	Juli – august 2022
Nye kældertrapper blok 4 – opgang 25 – 27B	Oktober – november 2022
Tag og gavle blok 5 øst	Juli – november 2022
Tag og gavle blok 5 midt	August – december 2022
Tag og gavle blok 5 vest	Oktober 2022 – januar 2023
Tag og gavle blok 6	November 2022 – marts 2023
Tag og gavle blok 1	December 2022 – april 2023
Tag og gavle blok 2	Januar – maj 2023
Tag og gavle blok 3	Marts – juni 2023
Tag og gavle blok 4	April – juli 2023
Nye radiatorer blok 5	August – december 2022
Afrigning, reetablering og aflevering	Juli – august 2023

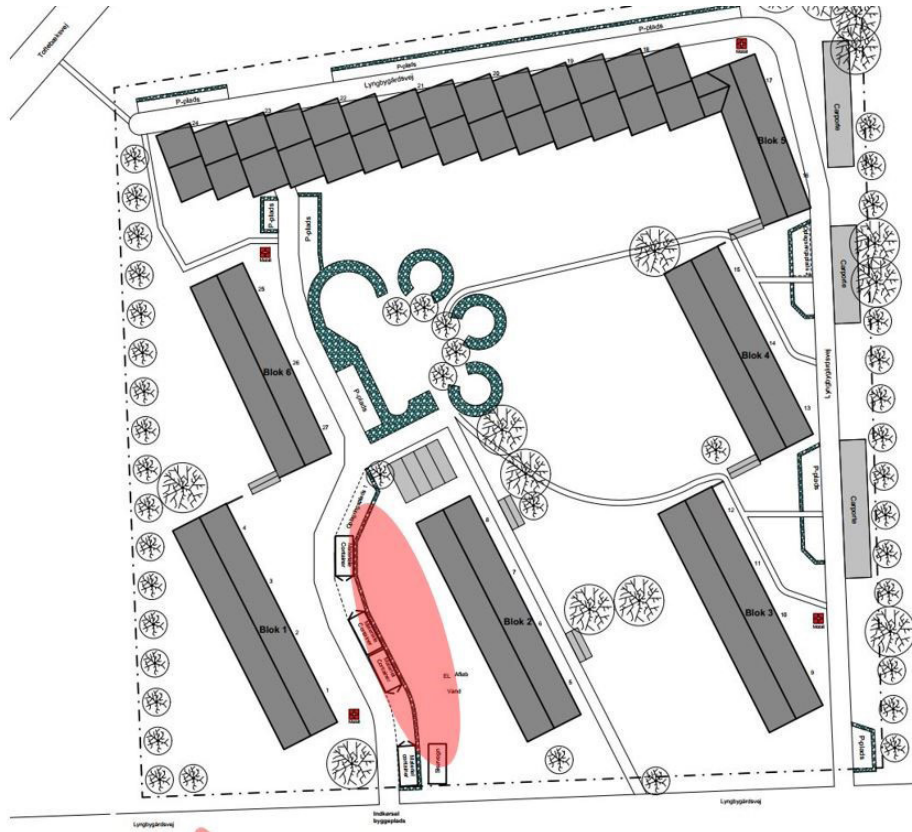

Byggepladsområde **Parkering er ikke mulig i byggeperioden**

På Vegne af Byggeudvalget
Lars Henrik Nielsen, Projekt-
leder, DAB
